结算 AI 工作台演示

按《结算工作专项方案》 T0-30 至 T0+20 流程走一遍

建项目 → 收资料 → 解析入库 → 现场验收 → 三算对比 → AI 初稿与复核 → 结算书初稿 → 定案归档

工程部 · 市场部 | 2026 年 11 月

演示数据已匿名化，仅用于内部演示

流程总览

一条主线：把资料、验收、结算、定案串起来

T0-30 启动准备	T0-30~T0-8 资料收集	T0-7~T0-5 现场验收	T0-3~T0+1 签章移交	T0+1~T0+5 结算编制	T0+6~T0+14 送审对数	T0+15~T0+20 定案归档
建项目 / 定人	附件 1—9	工程量确认	四家签章	三算 + 初稿	业主 / 中介	20 天底线

- T0 = 投产日； T0-30 到 T0+20 全部是日历天，节假日要提前预约签章和审计。
- 关键路径：资料定稿 → 四家签章 → 移交 → 结算书 → 业主送审 → 对数 → 返工 → 定案。
- 平台做的是把每个节点的资料、数据、复核记录留在一个项目下，节点一到就能取数。

资料一次成型

上传即解析，减少二次整理


三算差异留痕

设计 / 预算 / 结算同表对比

20 天定案倒排

预警、清单、复核都挂节点

先把项目、责任人和资料包立起来（T0-30~T0-8）

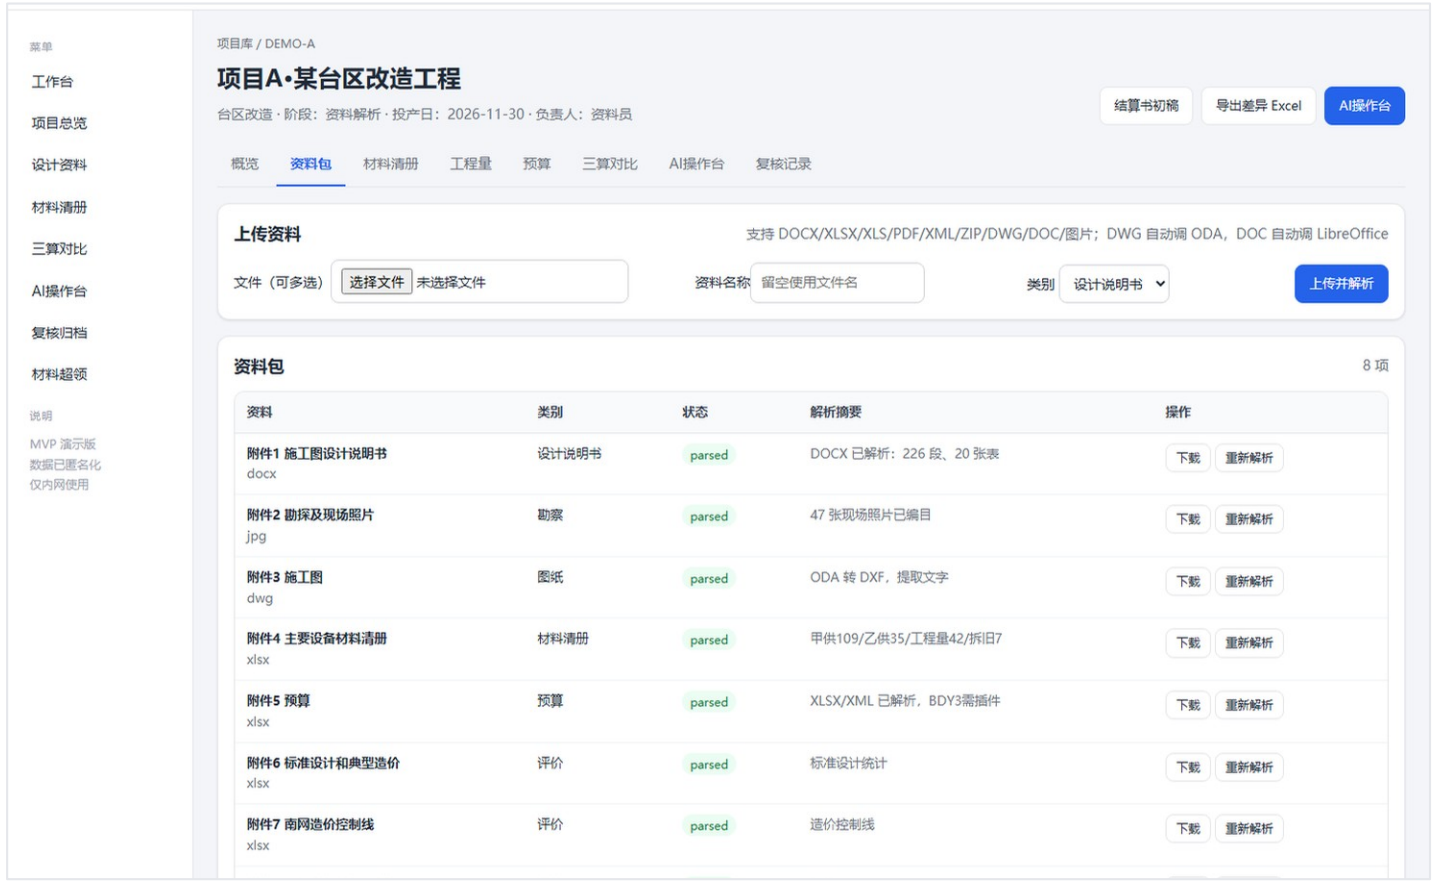


- 项目库建项目：编码、类型、投产日、负责人；成员按工程部 / 市场部 / 物资组加入。
- 附件 1—9 批量上传； DOCX/XLSX/PDF/XML/ZIP 自动解析， DWG 调 ODA ， DOC 调 LibreOffice 。
- 解析状态、缺项、插件缺口在同一页可见；原文件可下载。

演示话术

“资料不用先整理成统一格式，平台一边收一边解析，缺什么马上能看到。”

从文件变成可核对的数据（T0-8）

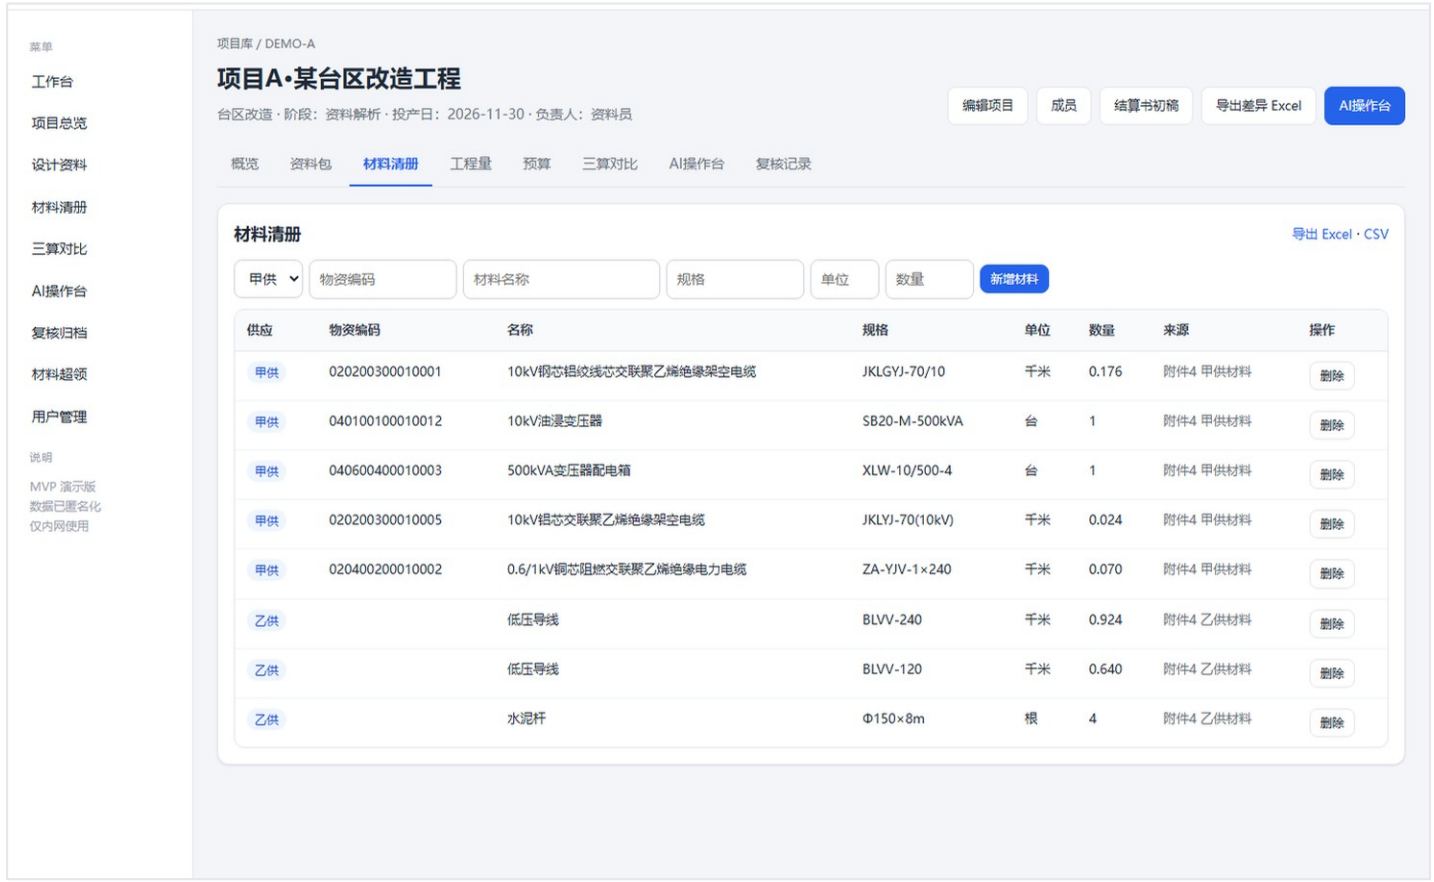

- 项目画像、甲供 / 乙供材料、工程量、预算解析后自动入库。
- 解析错了可以在页面直接增删，不用改数据库；材料 / 工程量 / 预算都能导出 Excel 。
- 材料量按三相、预留、拆旧规则解释，不能把正常差异判成错误。

先校准，再对比

“项目画像和材料数量先人工确认，确认后的数据才进入三算对比。”

设计、预算、结算同表，差异逐条落地（T0+1~T0+5）



- 同一张表看设计量、预算量、结算量，差异单独列。
- 每条差异写原因、挂依据，结算量可更新，导出 Excel 给业主 / 中介。
- 重点不是算总数，而是把差异落到项目、材料、依据和责任人。

演示话术

“对数时能逐条说明，不靠记忆；业主问哪条，直接打开依据。”

AI 出初稿，人做判断（T0+1~T0+5）




- AI 操作台：资料完整性检查、设计资料解析、三算对比、结算书初稿、对数问答。
- 每条输出标“规则初稿 / 私有化 LLM”，复核人通过 / 退回，记录留痕。
- AI 不签章、不定案、不对外承诺；数字必须复算。

人机边界

“AI 把初稿和依据找出来，省的是翻资料时间；签章和定案还是人。”

把编制时间留给量价判断（T0+5~T0+20）

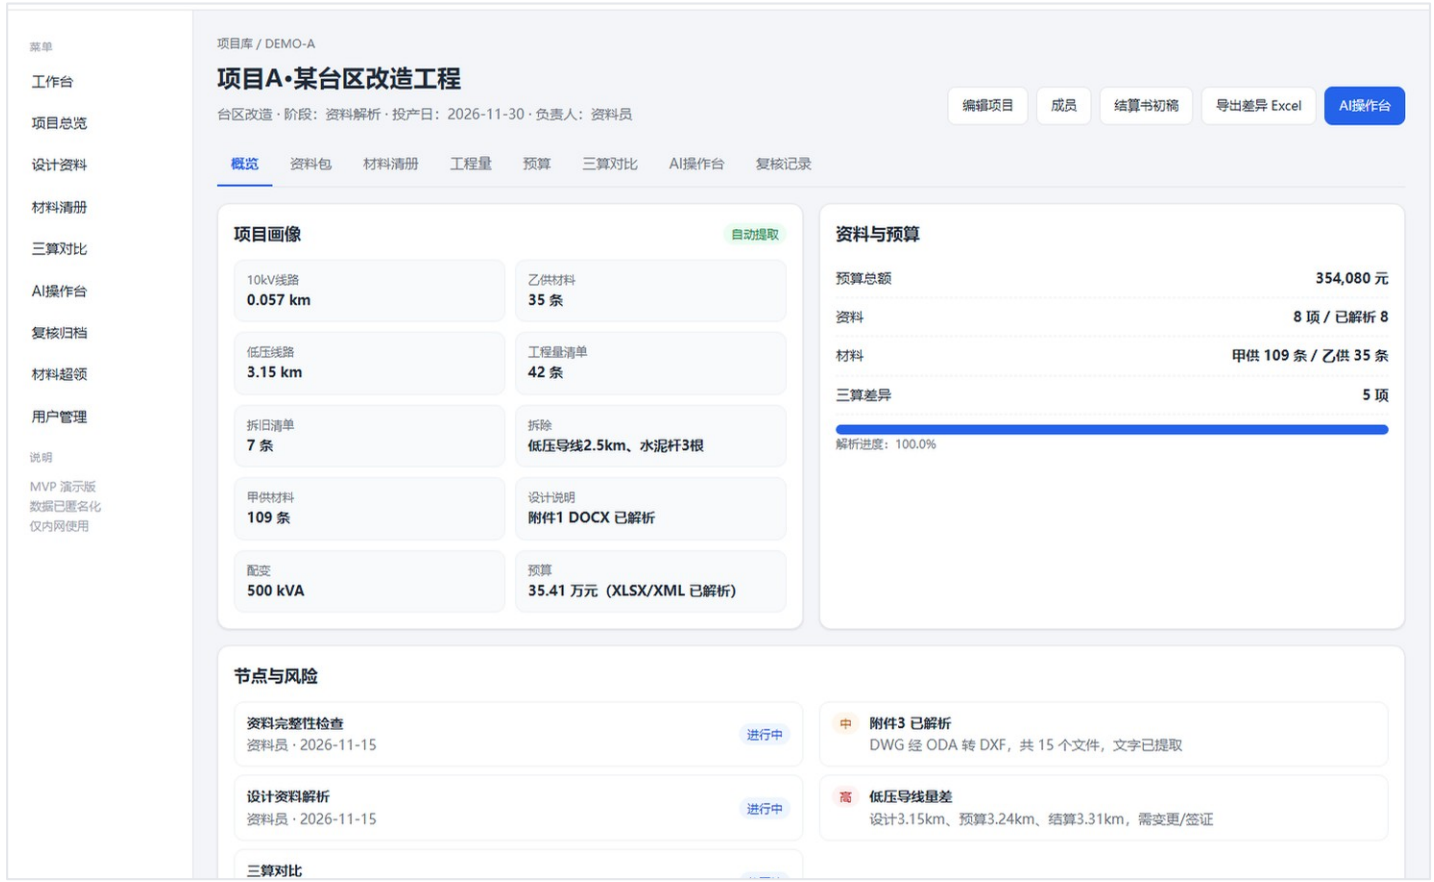


- 一键生成结算书初稿 Excel：封面、项目画像、材料、工程量、三算、预算。
- 初稿人工复核后，随竣工资料送业主；对数问题按差异清单逐条回复。
- 定案后归档复核记录和审计日志，复盘量差、材料超领和工期偏差。

定案底线：T0+18 内控，T0+20 业主底线；平台按节点提醒，不改变人的决策。

现场演示

打开 /demo ， 5 分钟按这个顺序讲

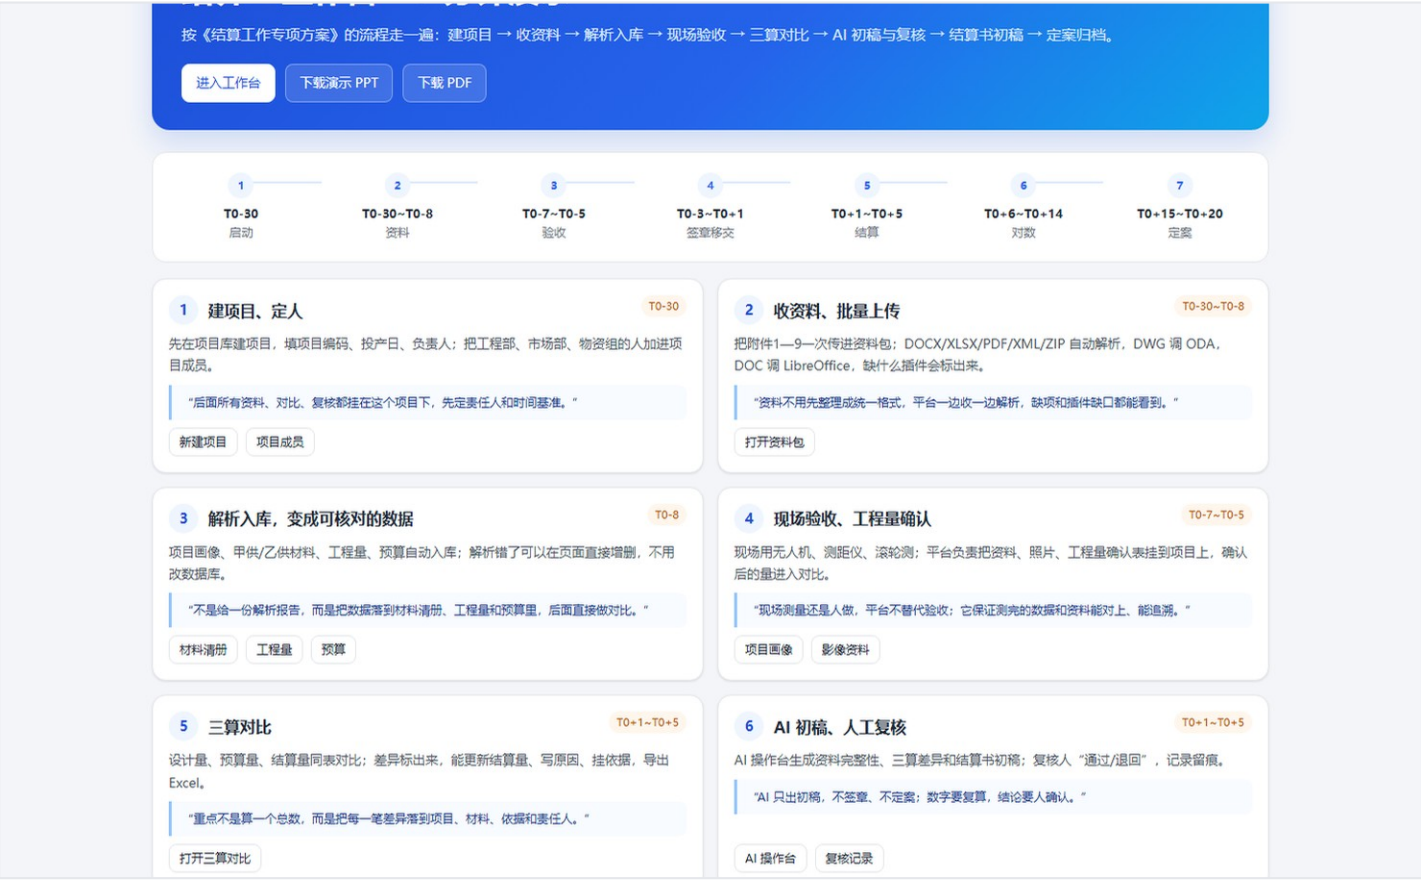

- 登录 admin/admin123 ，先改密码，再建账号、加成员。
- 按 /demo 的 8 个步骤点：资料包 → 材料 → 三算 → AI → 结算书初稿。
- 强调：数据匿名化；不接 SSO 和供电局系统； AI 只出初稿。

演示地址

http://127.0.0.1:8090/demo

从其他电脑访问时，用这台机器的局域网 IP 。
